



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

29.10.2014

№ 481

**О ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству
внутриквартальных территорий городского округа Тольятти
на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 5 февраля 2014 года
№ 308-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года**

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 5 февраля 2014 года № 308-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 15 октября 2014 года:
 - 1) проведены аукционы на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на сумму 58 524,32 тыс. рублей, заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на сумму 47 660,96 тыс. рублей, заключены договора субсидий на сумму 103 776,76 тыс. рублей;
 - 2) процент выполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за счет субсидий в рамках реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 5 февраля 2014 года № 308-п/1 (далее - План мероприятий), составил:
 - по ремонту и восстановлению твердых покрытий - 80% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь, ноябрь 2014 года);

001551

- по ремонту, восстановлению и устройству плоскостных сооружений - 61% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по установке малых архитектурных форм - 86% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по подготовке проектной документации - 27% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - ноябрь 2014 года);

- по устройству внутриквартального освещения - 20% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

3) процент выполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в рамках заключенных муниципальных контрактов:

- по благоустройству скверов - 45% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев - 16% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - ноябрь 2014 года);

- по озеленению - 0% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по восстановлению и устройству твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомобилей, расширению проездов, устройству ливневой канализации - 0% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь, ноябрь 2014 года);

- по установке малых архитектурных форм - 0% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по ремонту и восстановлению плоскостных сооружений - 0% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - октябрь 2014 года);

- по проектным работам - 0% (срок исполнения работ в соответствии с Планом мероприятий - ноябрь 2014 года).

3. Отметить неисполнение мэрией рекомендации решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года № 382 в части завершения работ по установке малых архитектурных форм, ремонту и восстановлению плоскостных сооружений, восстановлению и устройству твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомобилей, расширению проездов в срок до 15 октября 2014 года.

4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

1) представить в Думу информацию:


- в соответствии с заключением юридического управления аппарата Думы и заключением аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы;

- о планируемых сроках завершения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2014 году и причинах позднего проведения аукционов на выполнение работ, а также о причинах низкого процента выполнения работ;

2) принять меры по своевременному выполнению мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2014 году;

3) рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 3 августа 2011 года № 2281-п/1, предусматривающий выплату аванса получателям субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (в части ремонта, восстановления и устройства твердых покрытий тротуаров, проездов, дорожек, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, дождеприемных колодцев, внутриквартального освещения, в том числе спортивных, детских и хозяйственных площадок, установки ограждений и оборудования на них, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти), а также рассмотреть возможность упрощения процедуры принятия департаментом городского хозяйства мэрии отчета управляющей организации о произведенных затратах.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

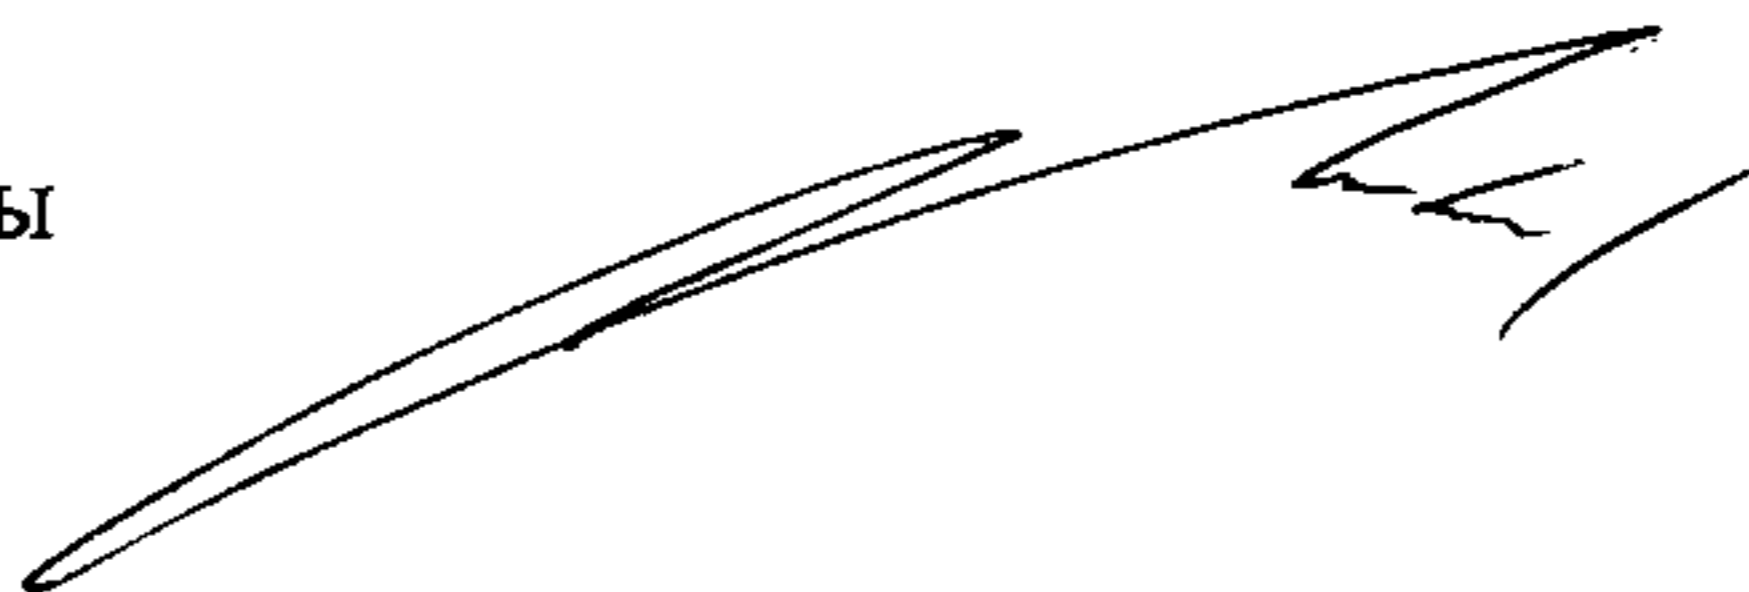

Д.Б.Микель
